

बराहताल गाउँपालिकाको योजना शाखाको आ.व.२०७७/०७८ को अर्धवार्षिक प्रगती समिक्षा



राजिमान बुढा
योजना अधिकृत
बराहताल गाउँपालीका, सुर्खेत

गाउँपालिका तर्फ (पूँजिगत)

सि.नं .	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	अर्गानिक मल तथा जैविक विषादी उद्योग गत वर्षको जिम्मेवारी	४०,२९,०००	२८,५४,५६५	१००.००	७०.८५	११,७४,४३५
२	ओदालताल सलैना कटुवाल डाँडा सडक गत वर्षको जिम्मेवारी	१५,००,०००	०	३०.००	०.००	१५,००,०००
३	करंगे ताल मर्मत गत वर्षको जिम्मेवारी	१०,०००	०	०.००	०.००	१०,०००
४	कल्याण करंगे सडक निर्माण साझेदारी प्रदेश सरकारसंग	७०,००,०००	०	४०.००	०.००	७०,००,०००
५	गिमिने रक्सेनी कृषि सडक गत वर्षको जिम्मेवारी	१६,०७,०००	१६,०६,५८४	१००.००	९९.९७	४१६
६	गिरीघाट रानीघाट पाग्मा बुङघाट कर्णाली सडक निर्माण साझेदारी प्रदेश सरकारसंग	७०,००,०००	०	३०.००	०.००	७०,००,०००
७	जमुने पानी मर्मत गत वर्षको जिम्मेवारी	२०,०००	०	०.००	०.००	२०,०००

गाउँपालिका तर्फ (पूँजिगत)

सि.नं .	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
८	झाफ्रि लिफ्ट खा.पा. योजना गत वर्षको जिम्मेवारी	२०,००,०००	१९,५०,९४१	१००.००	९७.५५	४९,०५९
९	झारखेत सलाप रतुराय मटेला लामकाने चिसाभित्ता सडक निर्माणको भुत्तानी दिन बाँकी गत बर्षको	३,९३,०००	३,९२,४६४	१००.००	९९.८६	५३६
१०	ठुलो सम्मा झोलुंगेपुल साझेदारी (गत वर्षको जिम्मेवारी)	२,३९,०९९	२,३९,०९९	१००.००	१००.००	०
११	तरङ्गा लिफ्ट सिचाई योजना गत वर्षको जिम्मेवारी	१,३४,५०,०००	५५,२५,६०८.५०	९०.००	४१.०८	७९,२४,३९१.५०
१२	तल्लो तरंगा छाप्रे सडक (गत बर्षको जिम्मेवारी)	१०,१८,०००	०	०.००	०.००	१०,१८,०००
१३	धनिगाड खानेपानी साझेदारी गत बर्षको जिम्मेवारी	२५,००,०००	२४,६६,७३२	१००.००	९८.६७	३३,२६८
१४	ने.रा प्रा.वि. ग्वालेकाँडा भवन निर्माण गत वर्षको जिम्मेवारी	२०,००,०००	१९,७६,७७४	१००.००	९८.८४	२३,२२६


गाउँपालिका तर्फ (पुँजिगत)

सि.नं .	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१५	ने.रा मा.वि. नयाँवन भवन निर्माण गत वर्षको जिम्मेवारी	५०,००,०००	१७,४९,४९६	१००.००	३४.९९	३२,५०,५०४
१६	पिडहाले सडक मर्मत गत वर्षको जिम्मेवारी	५५,०००	५४,७१५	१००.००	९९.४८	२८५
१७	बुटी खानेपानी निर्माण गत वर्षको जिम्मेवारी	१०,००,०००	८,८४,७५७	१००.००	८८.४८	१,१५,२४३
१८	बड्डीचौर शहरी सडक गत वर्षको जिम्मेवारी	१९,६७,०००	०	३०.००	०.००	१९,६७,०००
१९	बसन्तपुर सोलार मुस परियोजना गत बर्षको जिम्मेवारी	३७,८०,०००	११,६९,१६३	९०.००	३०.९३	२६,१०,८३७
२०	मेशिनरी तथा औजार	१२,००,०००	९५,८४०	१००.००	७.९९	११,०४,१६०
२१	मसिना गवेना देउराली सडक गत बर्षको जिम्मेवारी	१५,००,०००	०	३०.००	०.००	१५,००,०००

गाउँपालिका तर्फ (पूँजिगत)

सि.नं .	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
२२	विउरेनी लामकाने नयाँवन सडक निर्माण	१०,४२,४५८	९,५३,८५३	१००.००	९१.५०	८८,६०५
२३	श्री सरस्वती मा.वि. भवन निर्माण गत बर्षको जिम्मेवारी	२०,००,०००	०	९०.००	०.००	२०,००,०००
२४	हुर्के किउरेनी कटा सडक निर्माण (गत वर्षको जिम्मेवारी सरेको)	६,१५,०००	६,१५,०००	१००.००	१००.००	०
२५	हाडेपानी खा.पा. मर्मत	१५,०००	०	०.००	०.००	१५,०००
२६	होमपाइप ढुवानी	१,००,०००	०	०.००	०.००	१,००,०००
कुल जम्मा		६,१०,४०,५५७	२,२५,३५,५९१.५०	६६.५४	३६.९१	३,८५,०४,९६५.५०

गाउँपालिका तर्फ
विनियोजित रकम : ६,१०,४०,५५७

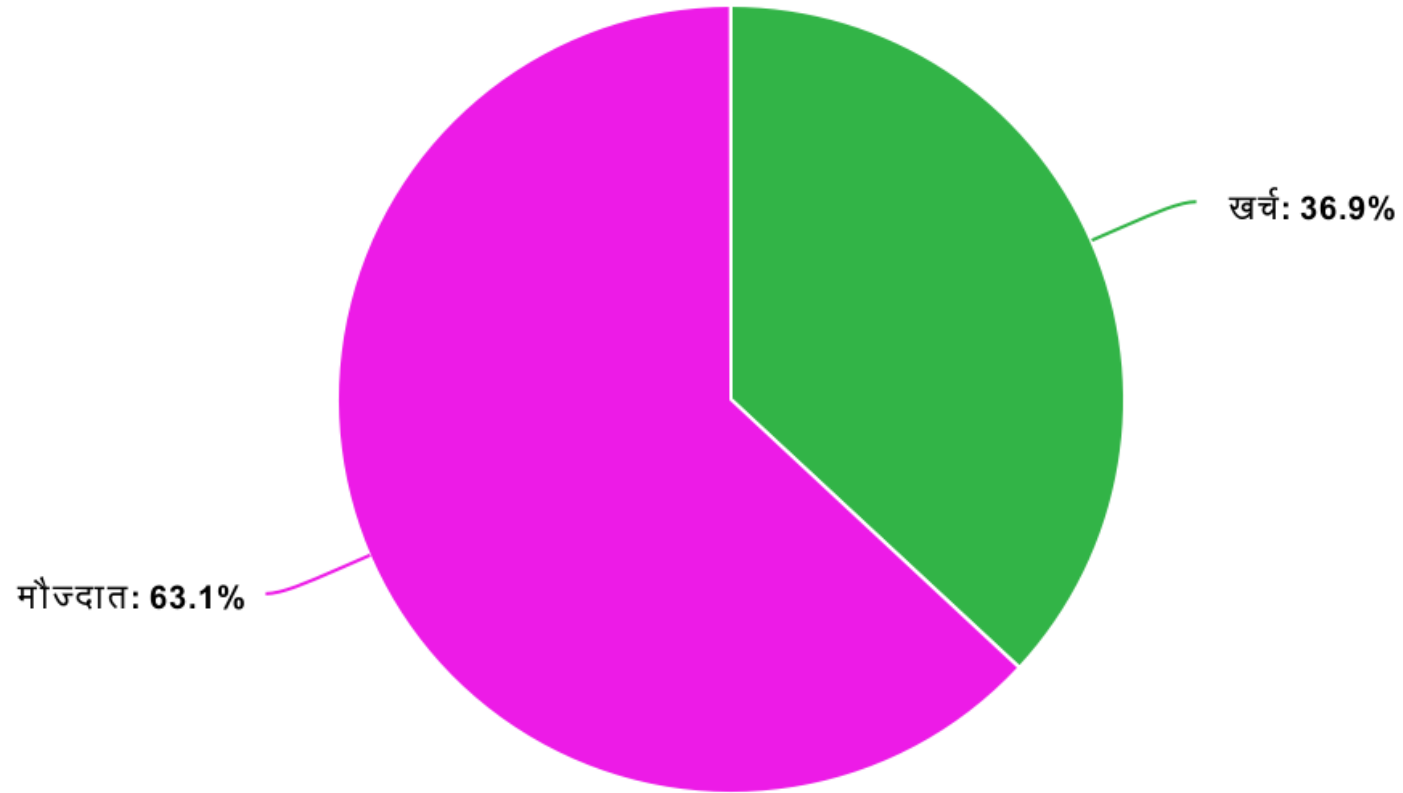

■ खर्च ■ मौज्दात

वडा नं. १ तर्फ (पूँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	आलिदमार कुवा निर्माण २ वटा	१,५०,०००	०	५०.००	०.००	१,५०,०००
२	गाडापानी कुवा निर्माण	१,००,०००	०	५०.००	०.००	१,००,०००
३	गाडापानी फिल्ड मर्मत	२,००,०००	१,६६,७००	१००.००	८३.३५	३३,३००
४	गोगनपानी कुवा मर्मत र पाईप खरिद	१,७५,०००	१,७३,३७०	१००.००	९९.०७	१,६३०
५	जनज्योती आ.वि ज्यामिरे फिल्ड मर्मत	२,००,०००	१,९७,५८२	१००.००	९८.७९	२,४१८
६	ज्यामिरे कुवा निर्माण	१,००,०००	९९,५८१	१००.००	९९.५८	४१९
७	डिपिङ्ग टंकी निर्माण तेलपानी २ वटा	८०,०००	०	३०.००	०.००	८०,०००


वडा नं. १ तर्फ (पूँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
८	ढकालवारी कुवा निर्माण	१,००,०००	०	५०.००	०.००	१,००,०००
९	तेलपानी खा.पा. टंकि निर्माण तथा पाईप लाईन विस्तार	५,००,०००	०	५०.००	०.००	५,००,०००
१०	ने.रा. आ. वि तेलपानी फिल्ड शौचालय मर्मत	१,५०,०००	०	०.००	०.००	१,५०,०००
११	ने.रा. आ. वि श्रीचौर चौतारी निर्माण	१,५०,०००	०	५०.००	०.००	१,५०,०००
१२	पाँचमुले कुवा निर्माण	१,००,०००	९८,७१२	१००.००	९८.७१	१,२८८
१३	मग्राह कुवा निर्माण	१,००,०००	९८,८६५	१००.००	९८.८७	१,१३५
१४	मग्राह पिक्निक स्पोर्ट शौचालय निर्माण	२,२५,०००	२,२०,६५२	१००.००	९८.०७	४,३४८

वडा नं. १ तर्फ (पूँजिगत)

सि.नं .	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१५	मेलपानी कुवा निर्माण	१,१६,०००	१,०९,३१६	१००.००	९४.२४	६,६८४
१६	श्रीचौर फिल्ड मर्मत	२,००,०००	०	०.००	०.००	२,००,०००
१७	सुधारिएको घट्ट ३ थान कप्सेरी,देउराली आलिदमार	३,००,०००	०	०.००	०.००	३,००,०००
१८	सल्लेरी कुवा निर्माण	१,००,०००	०	५०.००	०.००	१,००,०००
१९	हात्तिखाल सिचाइ पाइप खरिद	५,००,०००	०	०.००	०.००	५,००,०००
कुल जम्मा		३५,४६,०००	११,६४,७७८	५९.४७	३२.८४	२३,८१,२२२

वडा नं. १ तर्फ
विनियोजित रकम : ३५,४६,०००

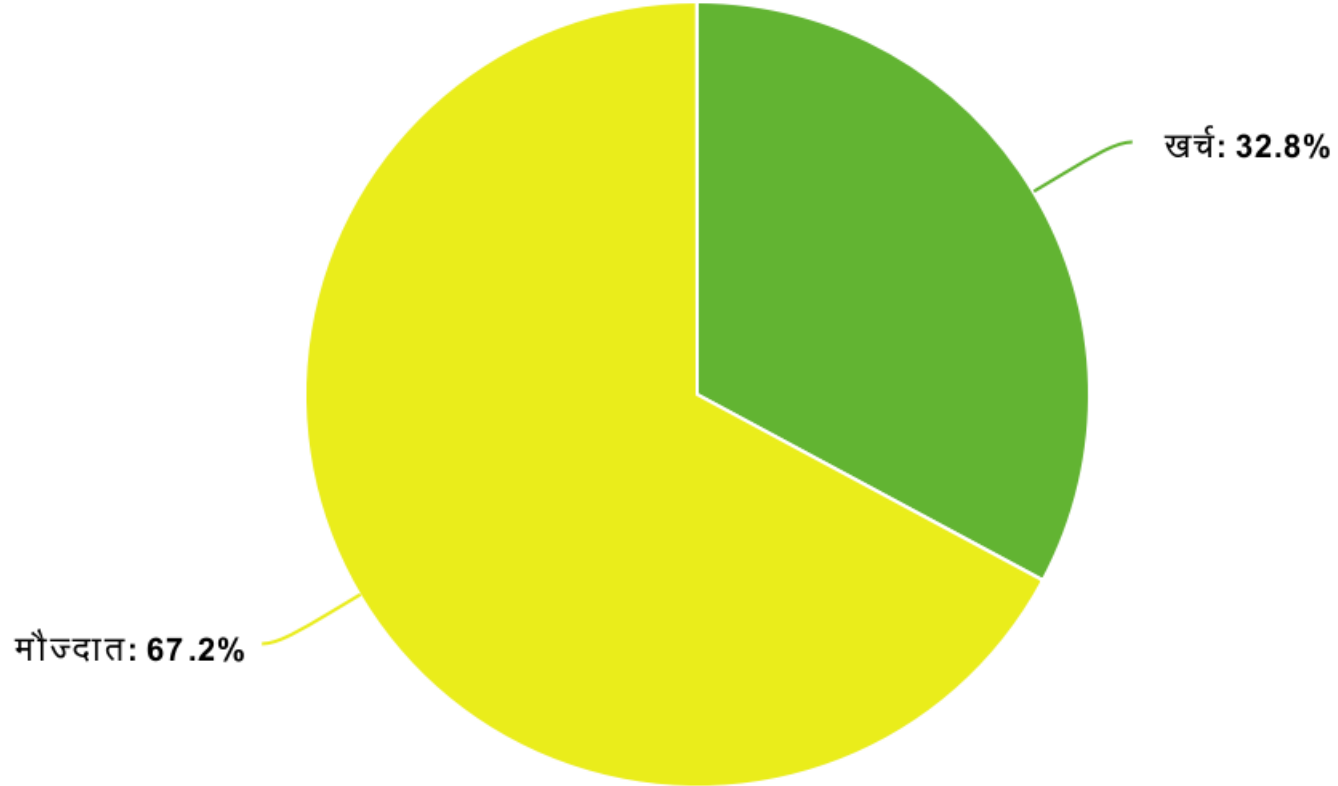

■ खर्च ■ मौज्दात


वडा नं. २ तर्फ (पुँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	खयरघारी ज्यामीरेकुना बाटो निर्माण	१,००,०००	१,००,०००	१००.००	१००.००	०
२	खयरघारी शाखा कुलो निर्माण	१,१०,०००	१,१०,०००	१००.००	१००.००	०
३	खहरे खोला लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना	५,००,०००	०	०.००	०.००	५,००,०००
४	जनजागृति प्रा.वि. भित्रीकुना वार्डिङ	२,५०,०००	२,४७,९३७	१००.००	९९.१७	२,०६३
५	डिपिङ ट्याङ्कि निर्माण, रानीघाट	५०,०००	५०,०००	१००.००	१००.००	०
६	थापाडेरा डिप बोरिङ्ग निर्माण	८,००,०००	०	४०.००	०.००	८,००,०००
७	दर्लामीटोल खानेपानी कुवा निर्माण	१,००,०००	१,००,०००	१००.००	१००.००	०

वडा नं. २ तर्फ (पूँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
८	पशुतर्फ विविध कार्यक्रम	२,००,०००	२,००,०००	१००.००	१००.००	०
९	बुकाखाली सिस्नेरी खानेपानी मर्मत	७५,०००	०	०.००	०.००	७५,०००
१०	बडचौर खानेपानी कुवा निर्माण	१,००,०००	०	०.००	०.००	१,००,०००
११	रुईनदुंगा खानेपानी योजना मानपुर	१,००,०००	९९,५०९	१००.००	९९.५१	४९१
१२	वडास्तरमा वृक्षारोपण कार्यक्रम	१,००,०००	०	०.००	०.००	१,००,०००
१३	विजेश्वरी मा.वि. खानेपानी योजना	६,५०,०००	६,४५,९०४	१००.००	९९.३७	४,०९६
१४	विजेश्वरी मा.वि. विद्युत वाएरिंग	४,५०,०००	४,४५,४५९	१००.००	९८.९९	४,५४१
कुल जम्मा		३५,८५,०००	१९,९८,८०९	६७.१४	५५.७५	१५,८६,१९१

वडा नं. २ तर्फे
विनियोजित रकम : ३५,८५,०००

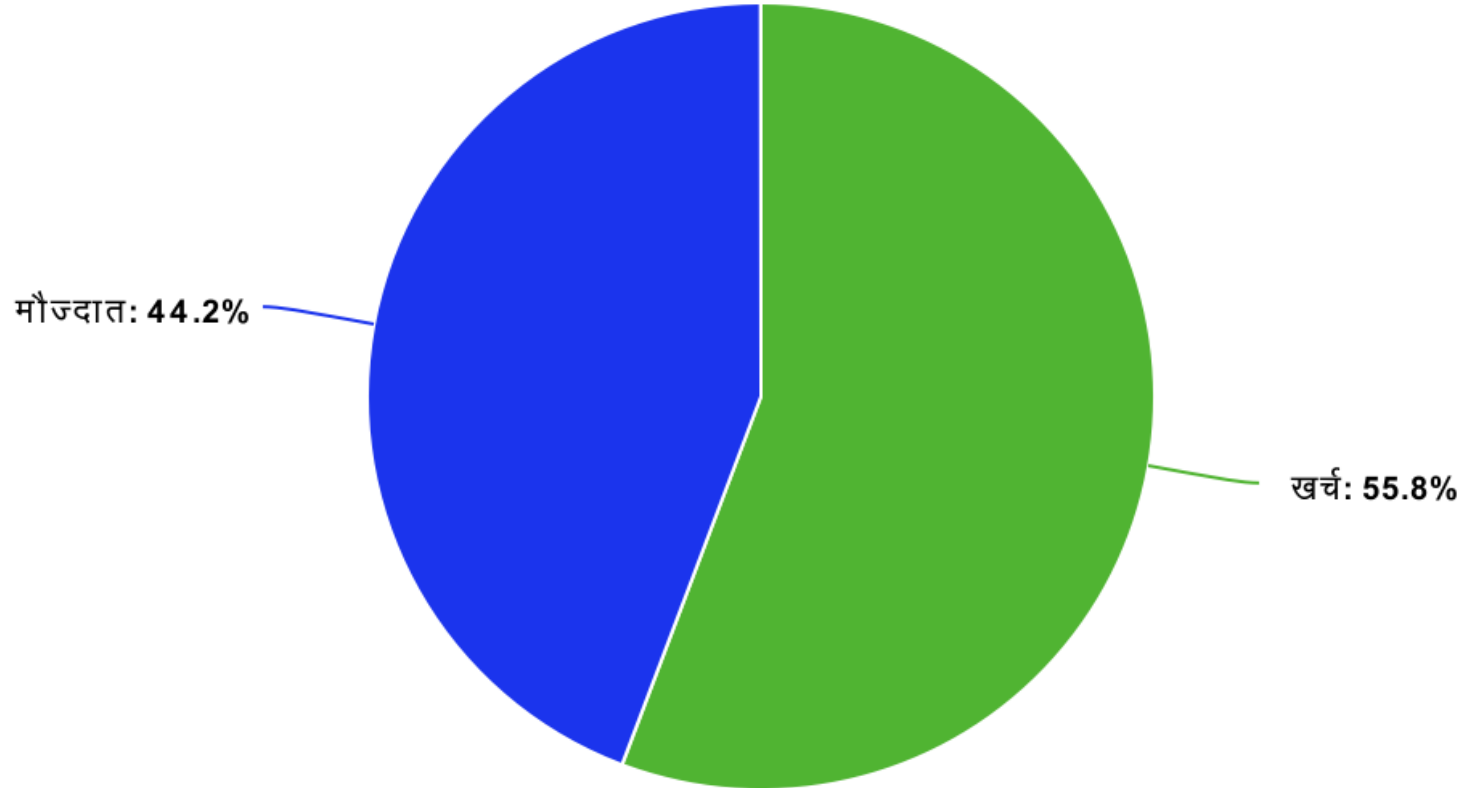

■ खर्च ■ मौज्दात

वडा नं. ३ तर्फ (पुँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	ओखेतेनी सिंचाई कुलो	२,००,०००	०	५०.०००.००		२,००,०००
२	ओखिल कुईनपानी पोखरी निर्माण केलाडी	३,००,०००	२,९३,५४५	१००.००९७.८५		६,४५५
३	गोगनपानी खा.पा. सिस्नेरी	२,००,०००	०	५०.०००.००		२,००,०००
४	ज्यामिरे सिंचाई कुलो तल्लो सिस्नेरी	२,५०,०००	०	५०.०००.००		२,५०,०००
५	ठुटे आप सिंचाई कुलो निर्माण	३,००,०००	०	५०.०००.००		३,००,०००
६	धारापानी खानेपानी विस्तार तथा ड्रम ट्याँकी खरिद	४,००,०००	०	५०.०००.००		४,००,०००
७	पशु तथा फलफुल संकलन केन्द्र मर्मत	२,५०,०००	०	५०.०००.००		२,५०,०००


वडा नं. ३ तर्फ (पुँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
८	बुङघाट कर्णाली सडक मर्मत	५,००,०००	०	५०.०००.००	५०.०००.००	५,००,०००
९	बराह आ.वि. नरसिहकाँडा फिल्ड निर्माण	२,५०,०००	०	५०.०००.००	५०.०००.००	२,५०,०००
१०	भैरवी आ.वि. सुकुरमाला टिप प्लास्टर	२,५०,०००	०	५०.०००.००	५०.०००.००	२,५०,०००
११	मालिका प्रा वि फिल्ड निर्माण	१,५०,०००	१,५०,०००	१००.०००.००	१००.०००.००	०
१२	रानीघाट पाग्मा हुदै बुङघाट सडक निर्माण	५,००,०००	०	५०.०००.००	५०.०००.००	५,००,०००
१३	वडा कार्यालय सभाहल निर्माण	७,७०,०००	०	३०.०००.००	३०.०००.००	७,७०,०००
१४	सुकुरमाला सिंचाई कुलो निर्माण	२,००,०००	०	४०.०००.००	४०.०००.००	२,००,०००

वडा नं. ३ तर्फ (पुँजिगत)

सि.नं .	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१५	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	६,४०,९७२	६,२०,११४	१००.००	९६.७५	२०,८५८
१६	साइखेति सिचाई कुलो निर्माण	१,१५,०००	०	५०.००	०.००	१,१५,०००
१७	सिद्रगैरा सिंचाई कुलो निर्माण	३,००,०००	०	४०.००	०.००	३,००,०००
१८	हरेकाँडा विद्यालय फिल्ड निर्माण	१,५०,०००	१,४९,०४८	१००.००	९९.३७	९५२
कुल जम्मा		५७,२५,९७२	१२,१२,७०७	५८.८९	२१.१७	४५,१३,२६५

वडा नं. ३ तर्फ
विनियोजित रकम : ५७,२५,९७२

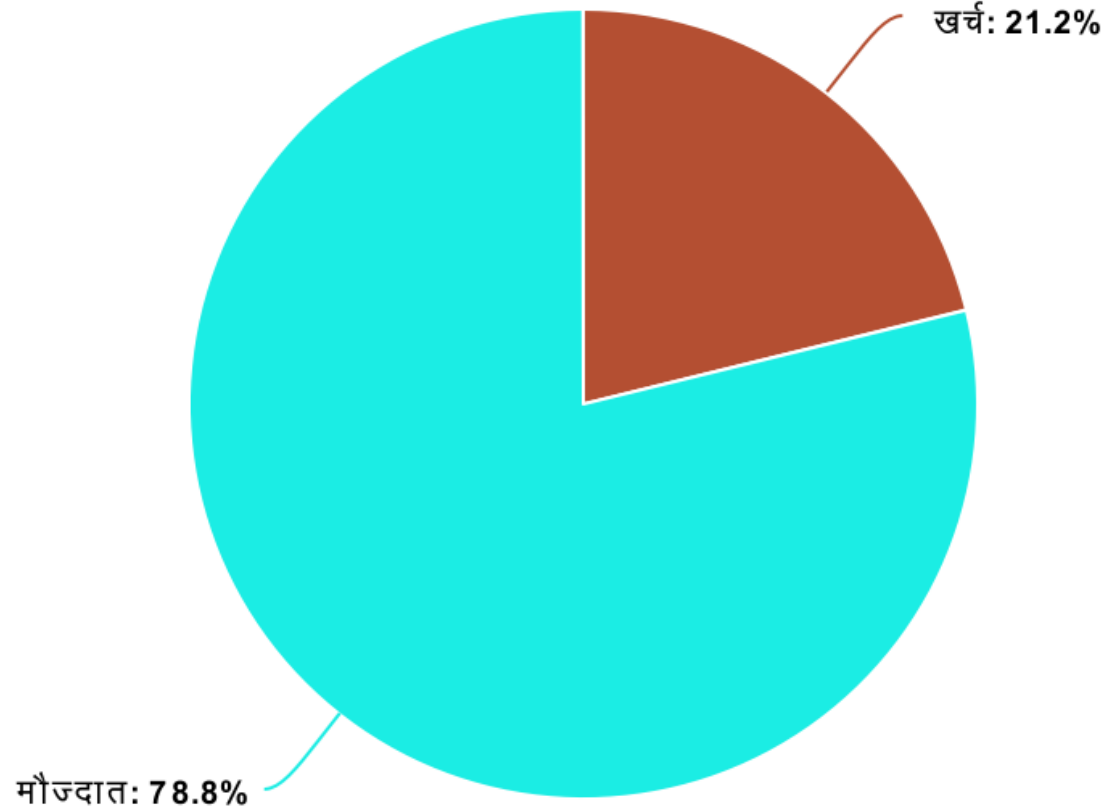


■ खर्च ■ मौज्दात

वडा नं. ४ तर्फ (पुँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	अस्थाई प्रहरी चौकी तरंगा मर्मत तथा फर्निचर	१,००,०००	०	०.००	०.००	१,००,०००
२	खेलमैदान घेरबार साजघाट	५,१५,०००	५,०८,८३८	१००.००	९८.८०	६,१६२
३	जनज्योती आ.वि.तरंगा भवन निर्माण	२७,००,०००	०	०.००	०.००	२७,००,०००
४	प्रगतिशिल विद्यालय भवन निर्माण क्रमागत	३,००,०००	०	५०.००	०.००	३,००,०००
५	राजी संग्राहलय कुटा शौचालय निर्माण	१,१०,०००	०	५०.००	०.००	१,१०,०००
६	रामजानकी आ.वि. कुटा कम्प्युटर खरिद	२,००,०००	०	०.००	०.००	२,००,०००
७	सडक सामाग्री	३०,०००	३०,०००	१००.००	१००.००	०
८	स्वास्थ्य चौकी तरंगा सोलार मर्मत	५०,०००	०	०.००	०.००	५०,०००
कुल जम्मा		४०,०५,०००	५,३८,८३८	३७.५०	१३.४५	३४,६६,१६२

वडा नं. ४ तर्फ
विनियोजित रकम : ४०,०५,०००

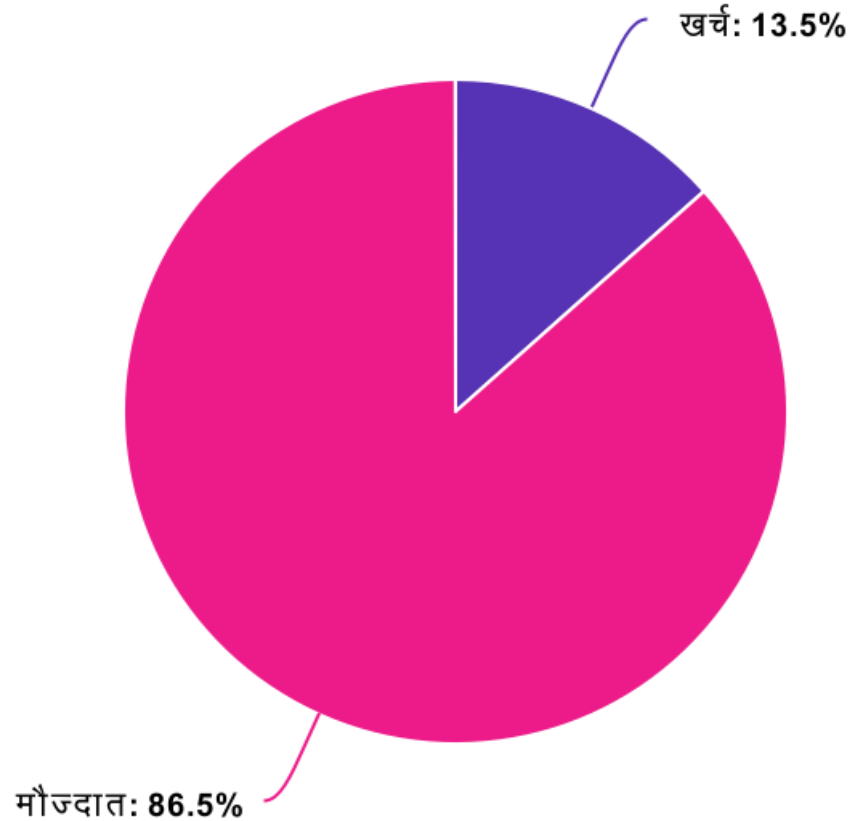

खर्च मौज्दात

वडा नं. ५ तर्फ (पुँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	कुनाथरी १ र २ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना बराहताल ५ चेपाङ्ग	७,००,०००	०	०.००	०.००	७,००,०००
२	कुनाथरी स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत	२,००,०००	०	०.००	०.००	२,००,०००
३	कुनाथरी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	०	०	०.००	०.००	०
४	खानेपानी पाईप तथा अन्य सामाग्री खरिद	१,००,०००	०	०.००	०.००	१,००,०००
५	गिमिने रक्सेनी कृषि सडक निर्माण (म्याचिड)	२,००,०००	०	०.००	०.००	२,००,०००
६	चिसापानी सिचाई कुलो निर्माण	१,००,०००	०	५०.००	०.००	१,००,०००
७	जनज्योति मा.वि. डिप बोरिङ्ग निर्माण	९,००,०००	०	५०.००	०.००	९,००,०००
८	टिभि खरिद प्रहरी चाैकी बड्डीचौर (गत बर्षको जिम्मेवारी)	३५,०००	३४,७५०	१००.००	९९.२९	२५०


वडा नं. ५ तर्फ (पुँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
९	ढल निकास सरसफाई तथा ल्याण्ड फिल्ड निर्माण	२,००,०००	०	०.००	०.००	२,००,०००
१०	तल्लो हातीखावा सिचाई कुलोको लागि मोटर तथा पाइप खरिद	१,००,०००	०	०.००	०.००	१,००,०००
११	तिजुपानी खानेपानी मर्मत करियापानी	१,९०,०००	०	५०.००	०.००	१,९०,०००
१२	नेवार खोला खा.पा. तथा सरसफाई आयोजना हल्दु	२,००,०००	०	५०.००	०.००	२,००,०००
१३	पयलपानी खा.पा. आयोजना करियापानी	०	०	५०.००	०.००	०
१४	बड्डीचौर सहरी सडक	३,००,०००	०	०.००	०.००	३,००,०००
१५	मसिना चेपाङ्ग सडक मर्मत	५,००,०००	४,९७,४२६	१००.००	९९.४९	२,५७४
१६	ल्यापटप खरिद	९०,०००	८९,९४८	१००.००	९९.९४	५२

वडा नं. ५ तर्फ (पुँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१७	शिद्धेश्वर कृषि तथा पशुपालन संस्था लि. ल्यापटप सफ्टवेयर खरिद	१,००,०००	०	०.००	०.००	१,००,०००
१८	सन्तनिरंकारी भवन निर्माण	५,००,०००	०	५०.००	०.००	५,००,०००
कुल जम्मा		४४,१५,०००	६,२२,१२४	३३.३३	१४.०९	३७,९२,८७६

वडा नं. ५ तर्फे
विनियोजित रकम : ४४,१५,०००

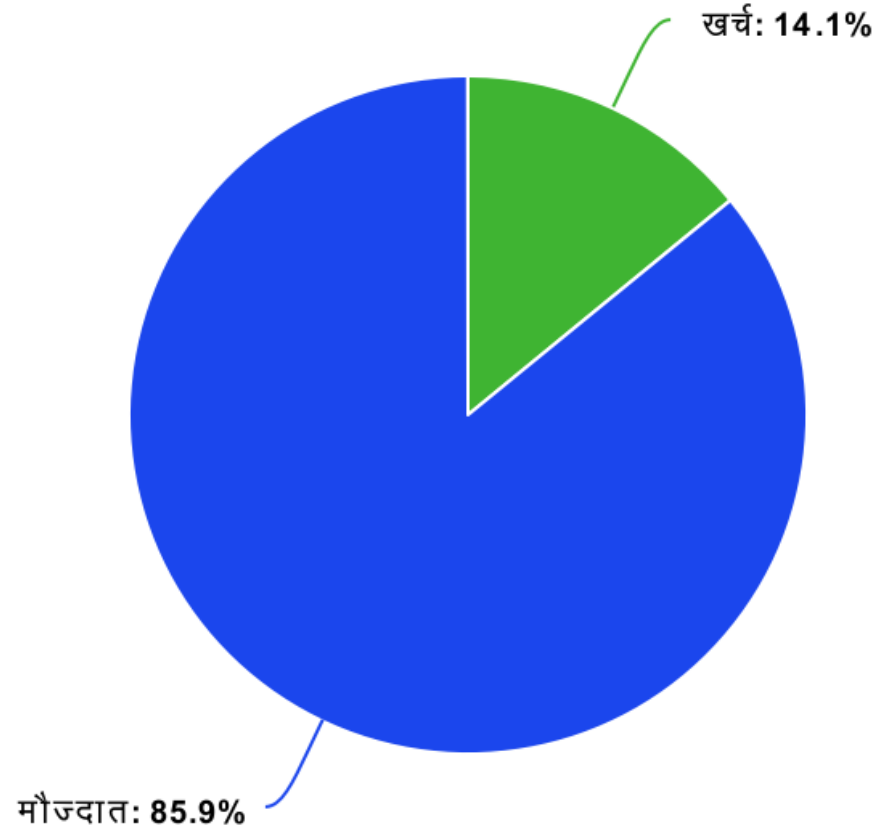

■ खर्च ■ मौज्दात


वडा नं. ६ तर्फ (पूँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	खड्का पलाट सिचाइ कुलो निर्माण	२,००,०००	०	०.००	०.००	२,००,०००
२	खम्बा सिरान कुलो निर्माण	२,००,०००	०	५०.००	०.००	२,००,०००
३	खानेपानी तथा सरसफाई जनचेतना कार्यक्रम	५०,०००	०	०.००	०.००	५०,०००
४	झारखेत सिचाई कुलो निर्माण	१,५०,०००	०	५०.००	०.००	१,५०,०००
५	धनकुटी सडक निर्माण	२,००,०००	०	०.००	०.००	२,००,०००
६	पाईप खरिद	१,५०,०००	०	०.००	०.००	१,५०,०००
७	पोखरीकाडा कुवा निर्माण	५,००,०००	०	५०.००	०.००	५,००,०००
८	बुटी सिचाई कुलो निर्माण	७,००,०००	०	५०.००	०.००	७,००,०००

वडा नं. ६ तर्फ (पूँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
९	भित्री विउरेनी सिचाई निर्माण	२,५०,०००	०	५०.००	०.००	२,५०,०००
१०	मैनाआफरी प्रतिक्शालय र खा.पा. निर्माण	१,५०,०००	०	५०.००	०.००	१,५०,०००
११	रतुराय सिचाई कुलो	१,००,०००	०	५०.००	०.००	१,००,०००
१२	वुटी शिव मन्दिर निर्माण	१,५०,०००	०	५०.००	०.००	१,५०,०००
१३	विउरेनि प्रतिक्शालय निर्माण	१,०५,०००	०	५०.००	०.००	१,०५,०००
१४	विउरेनि लामकाने सडक मर्मत	५,००,०००	९८,६७१	१००.००	१९.७३	४,०१,३२९
१५	विउरेनी तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण	१,५०,०००	०	०.००	०.००	१,५०,०००
१६	विउरानी सिरान कुलो	२,००,०००	१,८७,३३१	१००.००	९३.६७	१२,६६९
१७	सलापु सिरान कुलो निर्माण	२,५०,०००	०	५०.००	०.००	२,५०,०००
कुल जम्मा		४०,०५,०००	२,८६,००२	४१.१८	७.१४	३७,१८,९९८

वडा नं. ६ तर्फ
विनियोजित रकम : ४०,०५,०००

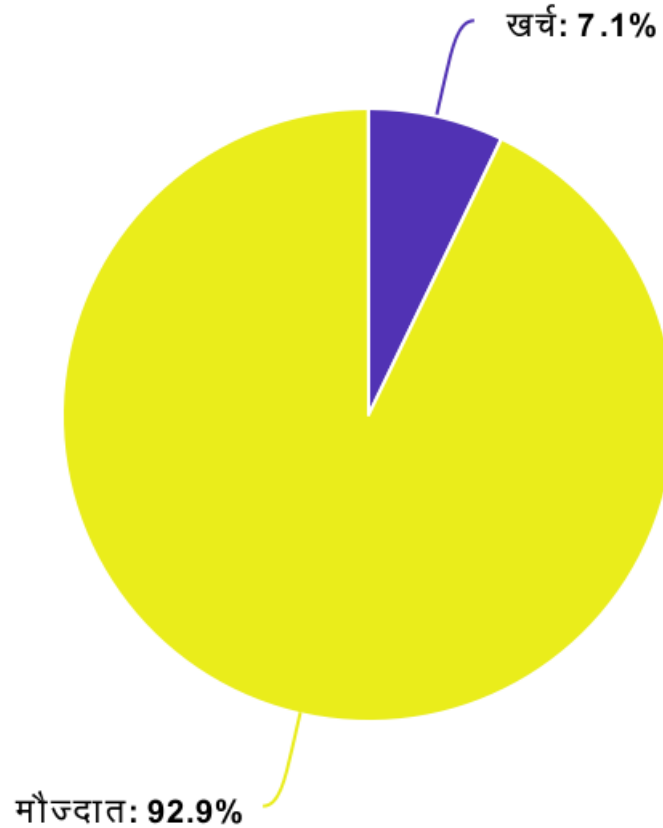


■ खर्च ■ मौज्दात

वडा नं. ७ तर्फ (पूँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	कल्यान स्याउले सडक मर्मत	१,५०,०००	१,४७,९६५	१००.००	९८.६४	२,०३५
२	खानेपानी तथा सिंचाई पाईप खरिद	१०,००,०००	७,५०,९३५	१००.००	७५.०९	२,४९,०६५
३	गाहाखाल भुम्की सडक मर्मत	१,५०,०००	१,४७,९९३	१००.००	९८.६६	२,००७
४	गिमिनेखोला धबेया सडक मर्मत	२,००,०००	१,९८,०५३	१००.००	९९.०३	१,९४७
५	पिडहाले सडक मर्मत (गत बर्षको जिम्मेवारी)	३५,०००	३५,०००	१००.००	१००.००	०
६	बाबरे शाखा बुलबुले सडक मर्मत	१,५०,०००	१,४४,५१२	१००.००	९६.३४	५,४८८
७	बालिकास नयाँवन पैयापानी सडक मर्मत	२,००,०००	१,९७,२९६	१००.००	९८.६५	२,७०४
८	सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई नयावनमा घेराबार र खानेपानि धारा जडान	२,००,०००	१,७५,३६३	१००.००	८७.६८	२४,६३७
कुल जम्मा		२०,८५,०००	१७,९७,११७	१००.००	८६.१९	२,८७,८८३

वडा नं. ७ तर्फ
विनियोजित रकम : २०,८५,०००

मौज्दात: 13.8%

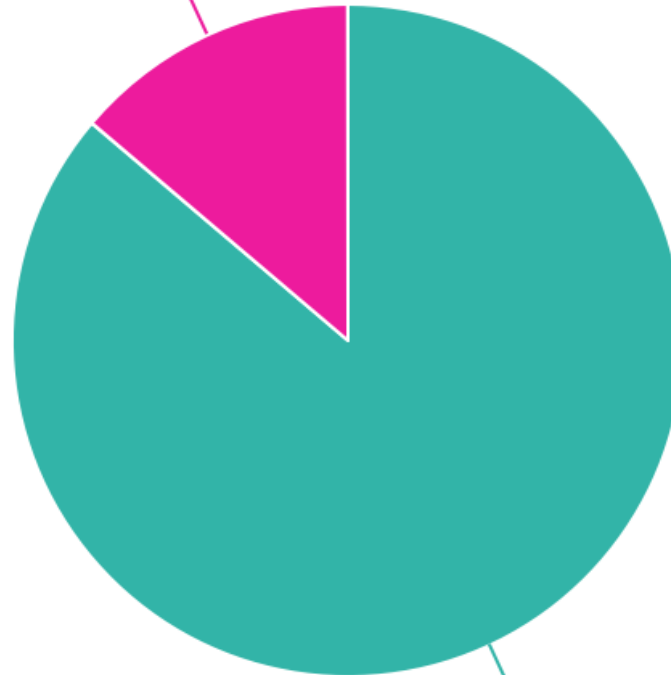

खर्च: 86.2%

खर्च

मौज्दात

वडा नं. ८ तर्फ (पुँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र रानीवन शौचालय निर्माण	२,००,०००	१,८४,०००	१००.००	९२.००	१६,०००
२	कुनाथरी पाइप खरिद	२,००,०००	०	०.००	०.००	२,००,०००
३	कपासे सिँचाई पाईप खरिद	१,१५,०००	०	०.००	०.००	१,१५,०००
४	कृष्ण मन्दिर निर्माण	५,५०,०००	०	४०.००	०.००	५,५०,०००
५	चिसापानी लामाखेत कूलो	२,५०,०००	०	५०.००	०.००	२,५०,०००
६	ज्यामुने खा.पा. निर्माण	२,५०,०००	०	५०.००	०.००	२,५०,०००
७	तुसारे खा.पा. टङ्की निर्माण	१,००,०००	०	५०.००	०.००	१,००,०००
८	दमार आमा समूह टिप पलास्टर	१,५०,०००	०	५०.००	०.००	१,५०,०००


वडा नं. ८ तर्फ (पुँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
९	ने.रा.प्रा.वि.ग्वालेकाँडा भवन निर्माण	३,००,०००	०	०.००	०.००	३,००,०००
१०	पशु डिपिङ्ग तथा पशु उपचार टुल बक्स खरिद	४०,०००	३०,०००	१००.००	७५.००	१०,०००
११	पानीचौर सिचाई पोखरी	८,५०,०००	०	०.००	०.००	८,५०,०००
१२	भट्टेघारी आमा समुह भवन टिप पलाष्टर	१,३०,०००	१,२७,६११	१००.००	९८.१६	२,३८९
१३	भट्टेघारी पोखरी निर्माण	१,६६,०००	१,६५,६३९	१००.००	९९.७८	३६१
१४	भट्टेघारी मन्दिर ट्रेस निर्माण	१,००,०००	०	५०.००	०.००	१,००,०००
१५	भुल्केपानी कूलो निर्माण	२,००,०००	१,९५,७१७	१००.००	९७.८६	४,२८३
१६	मसानेश्वर मन्दिर तारवार	१,२५,०००	०	५०.००	०.००	१,२५,०००

वडा नं. ८ तर्फ (पुँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१७	रानिवन खा.पा.	९,००,०००	८,९९,३०७	१००.००	९९.९२	६९३
१८	श्री कालिका प्रा.वि.चुलिडाँडा मर्मत	४,००,०००	३,९८,४९५	१००.००	९९.६२	१,५०५
१९	सोतखोला विसौनि गोरेटो बाटो निर्माण	४०,०००	०	०.००	०.००	४०,०००
कुल जम्मा		५०,६६,०००	२०,००,७६९	५४.७४	३९.४९	३०,६५,२३१

वडा नं. ८ तर्फ
विनियोजित रकम : ५०,६६,०००

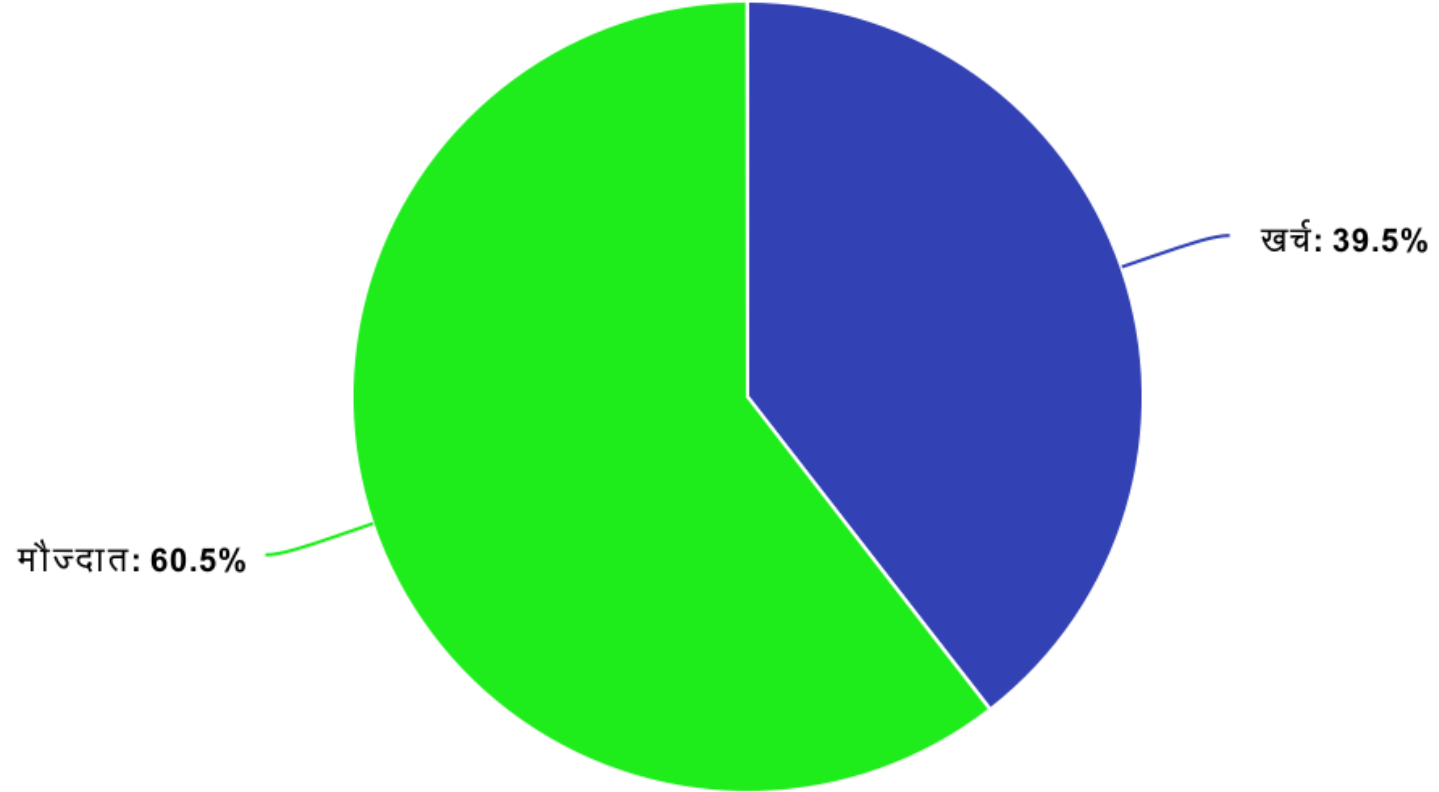

■ खर्च ■ मौज्दात

वडा नं. ९ तर्फ (पूँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	९ नं. वडाको सबै बाटो मर्मत	२,००,०००	१,९५,६८३	१००.००	९७.८४	४,३१७
२	अदुवा वेसार प्रशोधन गर्न विद्युत वाईरिड	१,००,०००	०	०.००	०.००	१,००,०००
३	कर्णाली भवन प्लाष्टर	१,००,०००	०	०.००	०.००	१,००,०००
४	कृषि संकलन भवन पुन निर्माण	३,००,०००	०	५०.००	०.००	३,००,०००
५	गौजेटरा सिचाई निर्माण	२,००,०००	०	५०.००	०.००	२,००,०००
६	थारी दोबाटो सडक	१,५०,०००	१,५०,०००	१००.००	१००.००	०
७	धारापानी कुलो निर्माण	१,५०,०००	०	५०.००	०.००	१,५०,०००
८	धारापानी खा.पा. पाईप डिजाईन	३,००,०००	०	०.००	०.००	३,००,०००


वडा नं. ९ तर्फ (पुँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
९	धारापानी खा.पा. मर्मत तथा वाईरिड	२०,०००	०	०.००	०.००	२०,०००
१०	पिपलसारे देखि उदोखोला डि.पि.आर गर्नको लागि	३,००,०००	२,९२,४२९	१००.००	९७.४७	७,५७९
११	बिहानी स्वास्थ्य आमा समूह भवन निर्माण	३,५०,०००	०	०.००	०.००	३,५०,०००
१२	भित्रीखोला सिचाई पाईप खरिद मसानेडाडा	२,००,०००	०	०.००	०.००	२,००,०००
१३	राम्रीखोला खा.पा. पाईप तथा ट्याङ्की निर्माण	७०,०००	०	०.००	०.००	७०,०००
१४	राम्रीखोला बाङ्गेखोला सिचाई आयोजना निर्माण	३,००,०००	०	५०.००	०.००	३,००,०००
१५	लसुने खा.पा.पाईप खरिद	१,५०,०००	०	०.००	०.००	१,५०,०००
१६	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	१,००,०००	४०,०००	४०.००	४०.००	६०,०००

वडा नं. ९ तर्फ (पुँजिगत)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१७	वडा नं. ९ को कार्यालय खा.पा. पाईप खरिद	२,००,०००	०	०.००	०.००	२,००,०००
१८	वेतखोला खा.पा. निर्माण	२,००,०००	०	५०.००	०.००	२,००,०००
१९	विहानी कृषि सहकारी संस्था लि. भवन निर्माण	६,००,०००	०	४०.००	०.००	६,००,०००
२०	श्रीमूल खानेपानी निर्माण	२७,००,०००	०	३०.००	०.००	२७,००,०००
२१	श्रीमूल खानेपानी निर्माणसम्म सडक निर्माण र मर्मत	३,००,०००	०	०.००	०.००	३,००,०००
२२	सरस्वति मा.वि.को चर्पी मर्मत	१,००,०००	०	०.००	०.००	१,००,०००
२३	स्वास्थ्य चौकि थारीलाई फर्निचर खरिद	५०,०००	०	०.००	०.००	५०,०००
कुल जम्मा		७१,४०,०००	६,७८,१०४	२८.७०	९.४९	६४,६१,८९६

वडा नं. ९ तर्फ
विनियोजित रकम : ७१,४०,०००

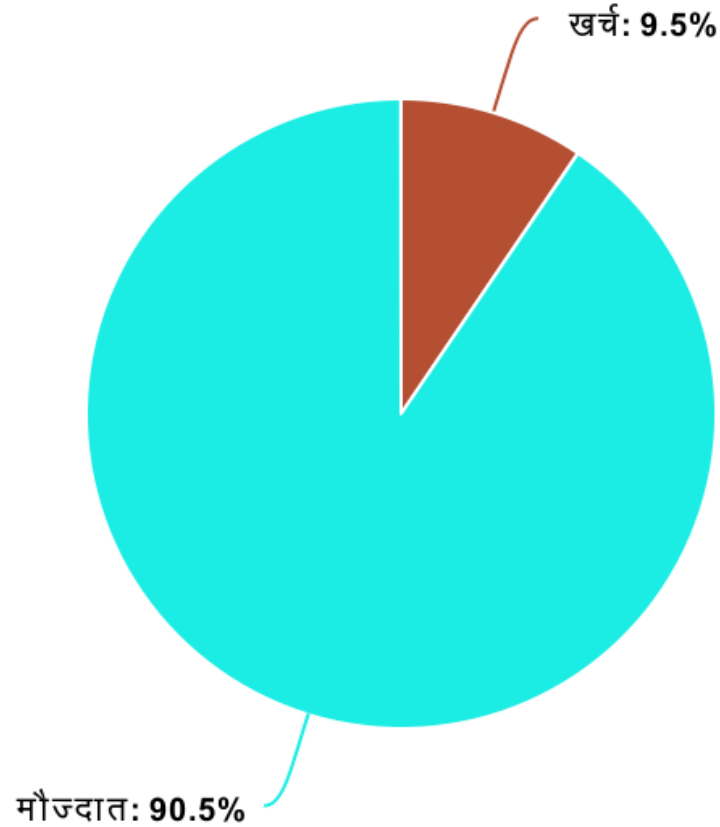


■ खर्च ■ मौज्दात

वडा नं. १० तर्फ (पुँजिगत)


सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	आपखर्क खा.पा. निर्माण	५,००,०००	४,८५,२४८	१००.००	९७.०५	१४,७५२
२	आमा समूह सभाहलहरुलाई कुर्चि खरिद	९४,०००	९३,२२५	१००.००	९९.१८	७७५
३	खरभिर खा.पा. निर्माण	५,००,०००	०	५०.००	०.००	५,००,०००
४	घाचापानी खा.पा. निर्माण	१३,००,०००	१२,८२,४१७	१००.००	९८.६५	१७,५८३
५	टाटी आमा समूह सभाहल निर्माण	५,००,०००	४,९०,१७३	१००.००	९८.०३	९,८२७
६	टाटी खा.पा. निर्माण	१३,००,०००	१२,८८,९०६	१००.००	९९.१५	११,०९४
७	थुम्का आमा समूह सभाहल निर्माण	५,००,०००	४,९०,५२७	१००.००	९८.११	९,४७३
८	धनिगाड आमा समूह सभाहल निर्माण	५,००,०००	४,९५,४६९	१००.००	९९.०९	४,५३१
९	वडा कार्यालय भवन निर्माण	२५,००,०००	०	५०.००	०.००	२५,००,०००
१०	सडकहरु मर्मत	५,००,०००	४,९२,९४५	१००.००	९८.५९	७,०५५
कुल जम्मा		८१,९४,०००	५१,१८,९१०	९०.००	६२.४७	३०,७५,०९०

वडा नं. १० तर्फ
विनियोजित रकम : ८१,९४,०००

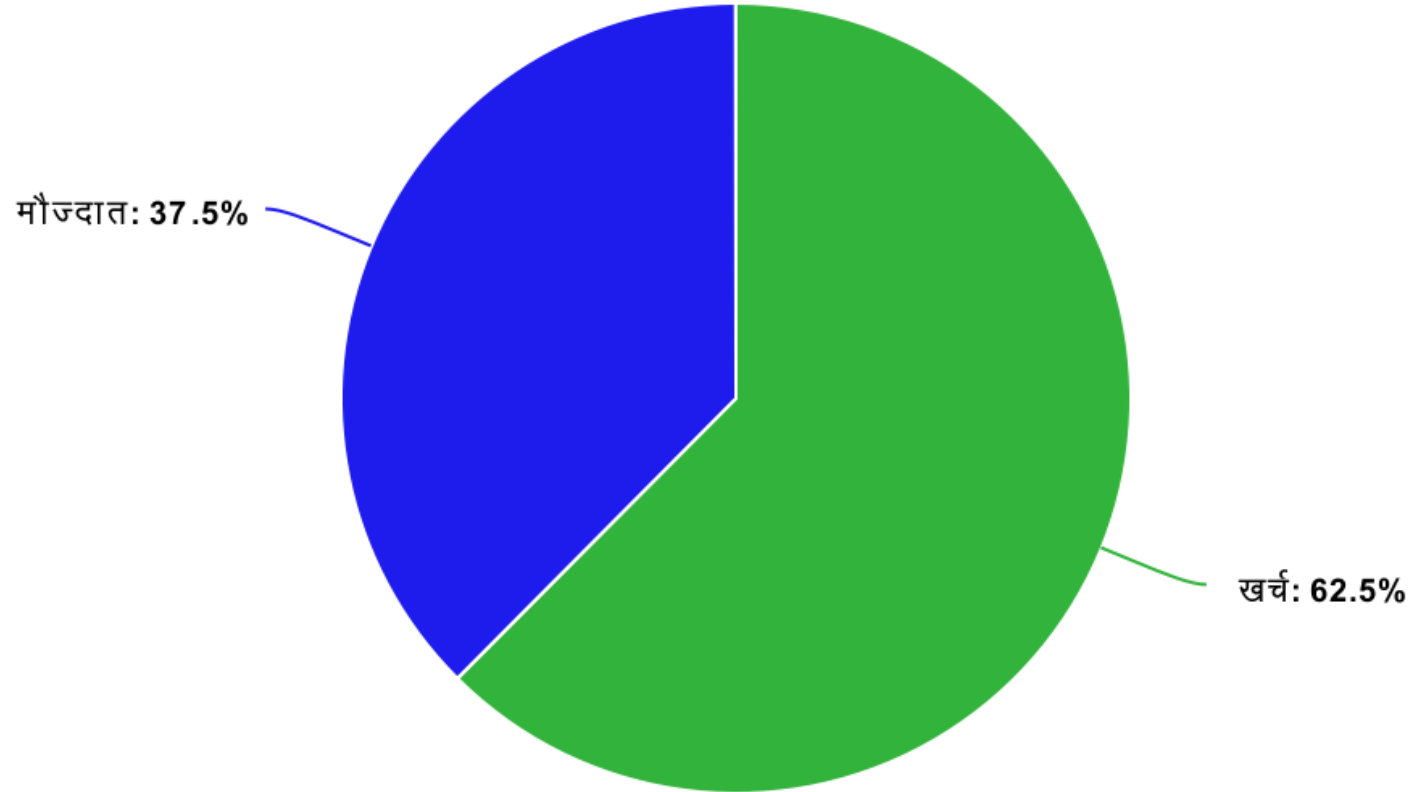


■ खर्च ■ मौज्दात

एकमुष्ट गा.पा.एवम् वडागत भौतिक प्रगति

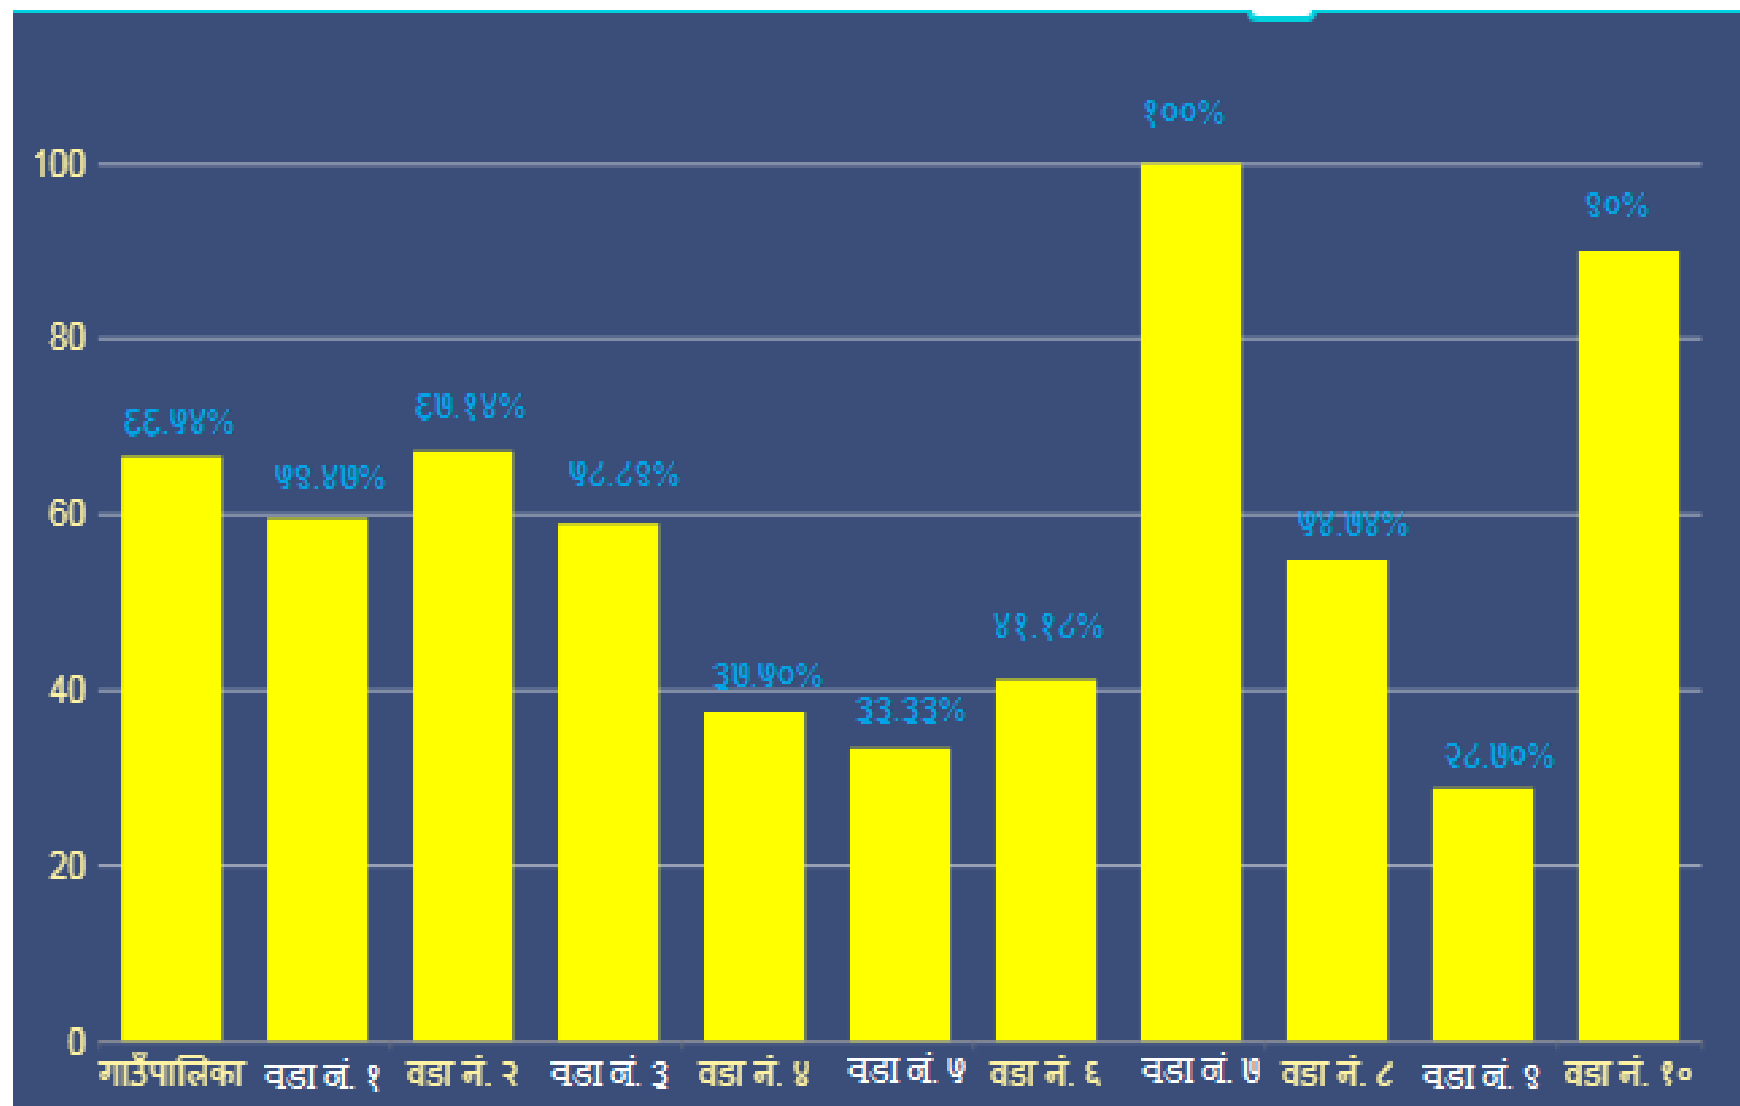

एकमुष्ट गा.पा.एवम् वडागत वित्तीय प्रगति

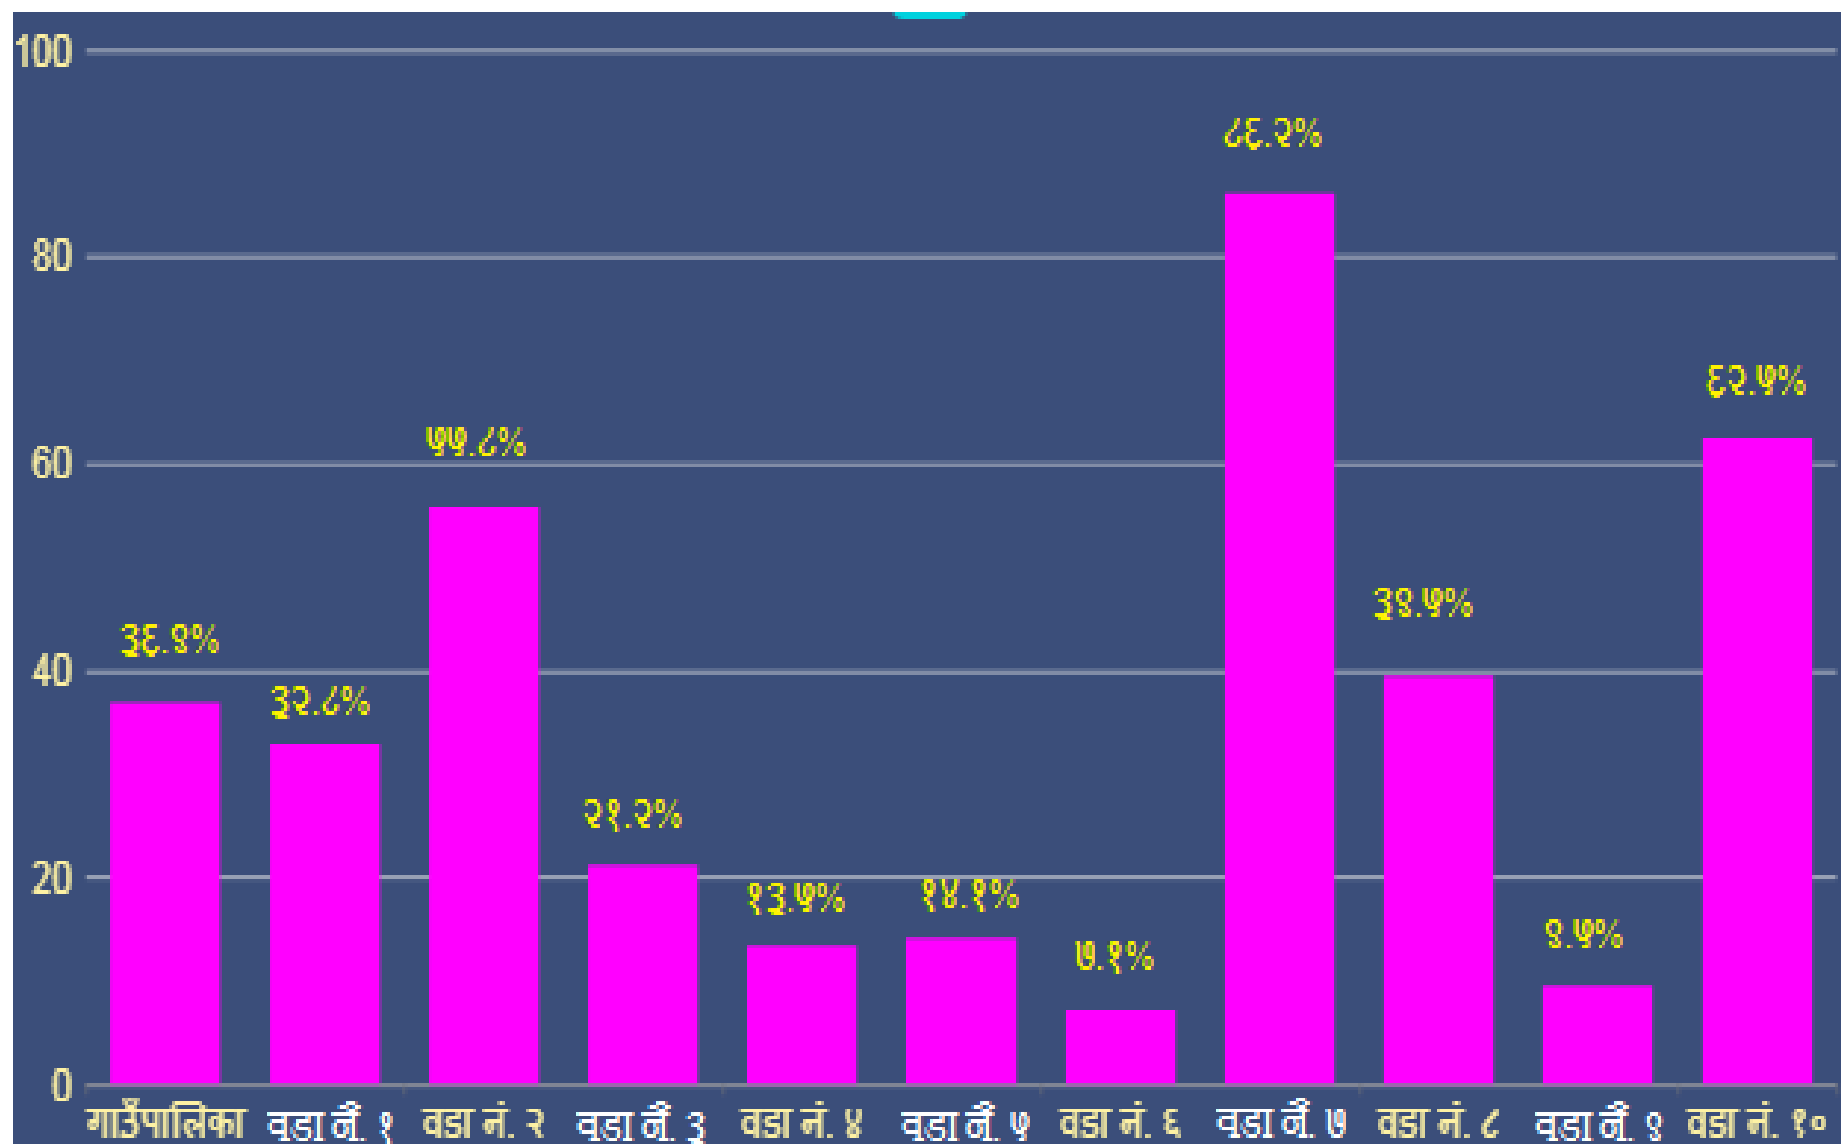

कर्णालि प्रदेश शसर्त अनुदान तर्फको विवरण

सि.नं .	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	ओदालताल खानेपानी आयोजना	३०,००,०००	०	५०	०.००	३०,००,०००
२	जनजागृती मावि पूर्वाधार निर्माण दमारे	२०,००,०००	०	३०	०.००	२०,००,०००
३	ठाटीबास सिंचाई ड्याम बराहताल	१०,००,०००	९,९५,२१५	१००	९९.५२	४,७८५
४	पोखरीकाँडा जनसेवा खानेपानी आयोजना स्याउले	१०,००,०००	०	५०	०.००	१०,००,०००
५	बिउरेनी सिंचाई कुलो निर्माण	२०,००,०००	०	५०	०.००	२०,००,०००
६	यज्ञ ज्योती आवि भवन निर्माण	२०,००,०००	०	५०	०.००	२०,००,०००
७	राचखोला सिंचाई कुलो निर्माण	१०,००,०००	०	५०	०.००	१०,००,०००
८	सरस्वती आवि पूर्वाधार निर्माण बराहताल	१०,००,०००	९,९०,५७५	१००	९९.०६	९,४२५
कुल जम्मा		१,३०,००,०००	१९,८५,७९०	६०	१५.२७	१,१०,१४,२१०

कर्णालि प्रदेश समपुरक अनुदान तर्फको विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	कल्याण करंगे सडक निर्माण	७०,००,०००	०	३०.००	०.००	७०,००,०००
२	गिरीघाट रानीघाट पाग्मा बुङ्घाट कर्णाली सडक निर्माण	७०,००,०००	०	३०.००	०.००	७०,००,०००
कुल जम्मा		१,४०,००,०००	०	३०.००	०	१,४०,००,०००


हस्तान्तरित कार्यक्रम- विशेष अनुदान तर्फको विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाक लापको नाम	स्रोत	विनियोजित	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	जनजागृती मावि दमार भवन निर्माण	नेपाल सरकार - विशेष अनुदान चालु	८०,००,०००	०	२५	०.००	८०,००,०००
२	बोझोपानी लिफ्टिङ सिंचाई	कर्णाली प्रदेश - विशेष अनुदान चालु	२०,००,०००	०	०	०.००	२०,००,०००
३	भ्याकुने सिंचाई कुलो निर्माण	कर्णाली प्रदेश - विशेष अनुदान चालु	२०,००,०००	०	९५	०.००	२०,००,०००
कुल जम्मा			१,२०,००,०००	०	६०	०	१,२०,००,०००

स्थानिय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तर्फको विवरण

सि.नं	योजनाको नाम	ठेगाना	विनियोजित रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	मौज्दात
१	लामकाने सिचाइ कुलो निर्माण	बराहताल ६	१०,००,०००	९०	०	१०,००,०००
२	श्री सरस्वती मा.वि. सिरुपाटा ६ कोठे भवन निर्माण	बराहताल ९	५०,००,०००	३०	०	५०,००,०००
३	गभेना आलडाडाँ सिचाइ कुलो निर्माण	बराहताल ५	१०,००,०००	०	०	१०,००,०००
कुल जम्मा			७०,००,०००	४०	०	७०,००,०००

अनुदान तर्फका योजनाहरुको भौतिक प्रगति

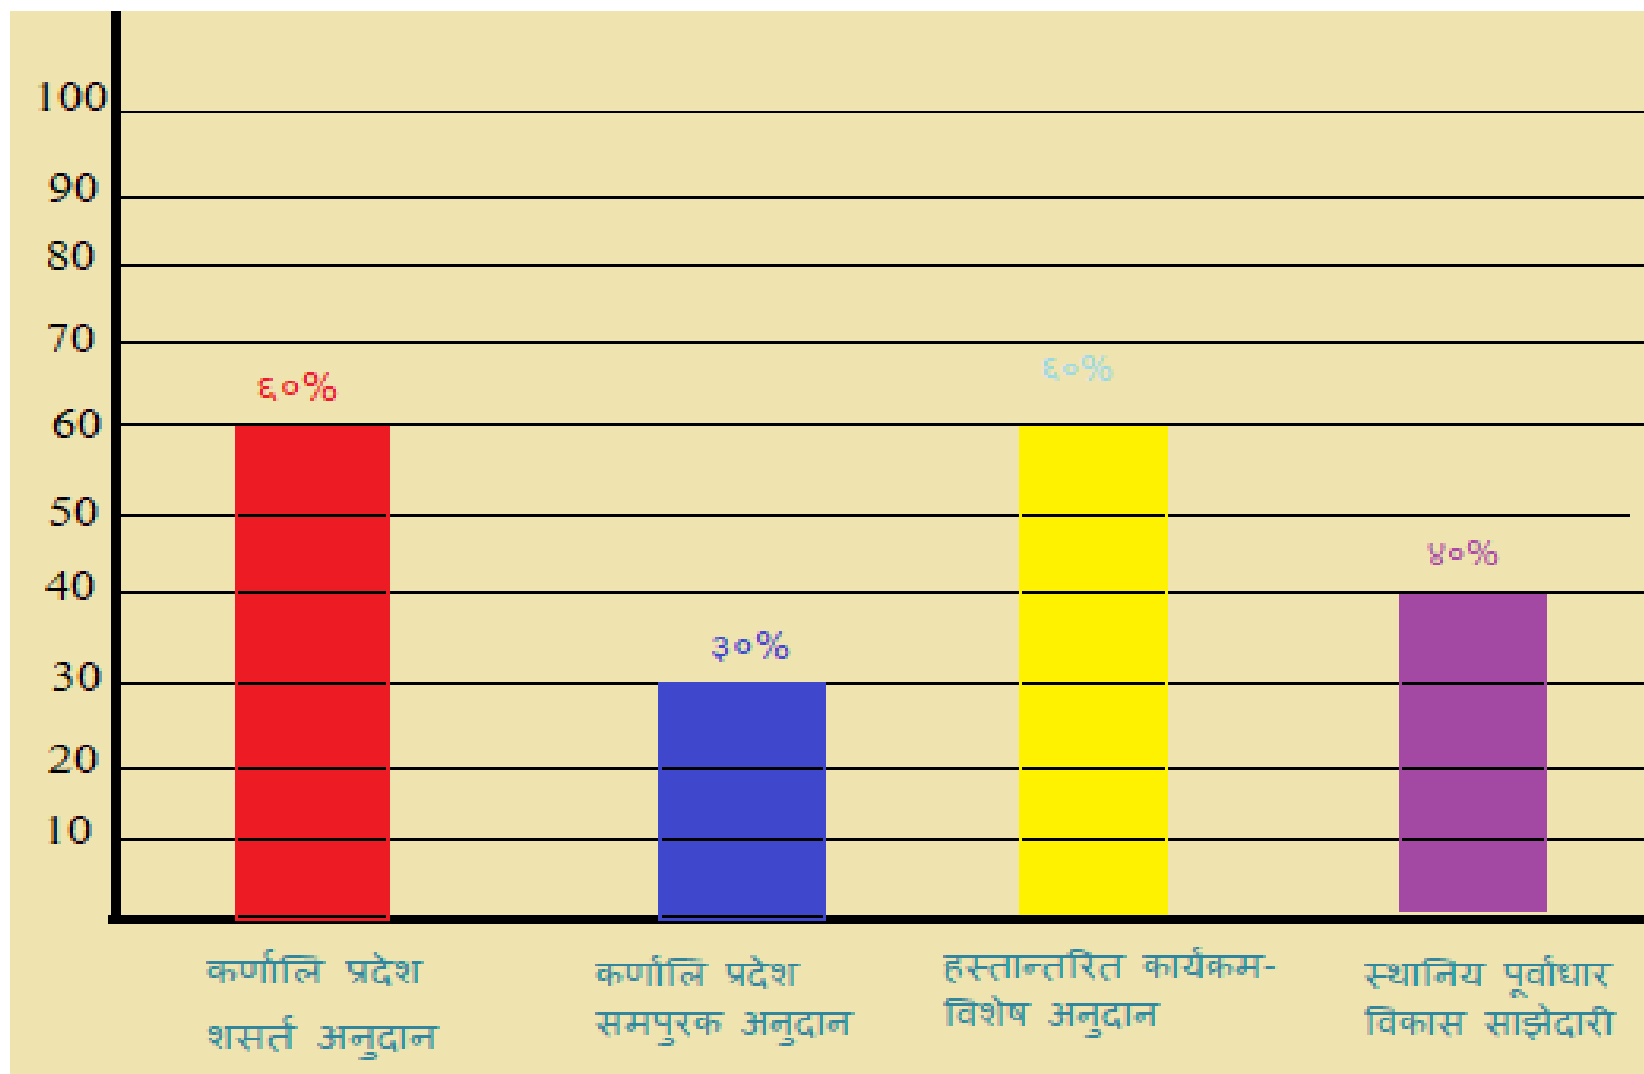

कार्यक्रम संचालनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरू

- कार्ययोजना अनुसार समयमा नै योजना सम्झौता र सम्पन्न नहुनु
- टुक्रे योजनाले उपेक्षित रूपमा दिर्गकालिन प्रगति नहुनु ।
- योजनाको म्यादथप र उपभोक्ताको रनिङ्ग विलको बारेमा कानुनीमा उल्लेख नहुनु ।
- उपभोक्तालाइ तालिमको व्यवस्था नहुनु ।
- योजनाको सप्टवयर नभएर काम गर्न कठिन हुनु ।

समस्या समाधानका लागि चालिएका कदमहरू

- समय मै काम सम्पन्न गर्नका लागि सरोकारवाला निकायलाई बारम्बार ताकेता गर्नु ।
- उपभोक्ता समितिको तालिमको लागि बजेटको व्यवस्थाको लागि गाउँपालिकामा अनुरोध गरेको ।
- योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन भेटघाट र फोन सम्पर्क गर्ने गरिएको ।
- केहि कानुनी समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकामा अनुरोध गरेको ।

सुझावहरु

- टुक्रे योजनाहरु लाई निरुत्साहित र ठुला र दिर्गकालिन योजनाहरु लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।
- उपभोक्ता समिति गठनमा पारदर्शिता हुनुपर्ने ।
- उपभोक्ताको वेसिक कागजातहरु वडा स्तरबाटै सहजिकरण गरिनुपर्ने।
- बजेट बनाउदा शिर्षक लामो र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको नभइ छोटो र एउटै अर्थ लाग्ने खालको बनाउनु पर्ने ।

सुझावहरु

- केहि कानून संसोधन गर्नु पर्ने ।
- ठुला आयोजनालाई प्राथमिकतामा पार्नु पर्ने ।
- योजनाहरु धेरै हुने भएकोले योजनाको सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- उपभोक्ताको क्षमता विकासको लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

बराहताल गाउँपालिकामा भए गरेका केहि गतिविधीहरु



बराहताल गाउँपालिकामा भए गरेका केहि गतिविधीहरु




बराहताल गाउँपालिकामा भए गरेका केहि गतिविधीहरु



बराहताल गाउँपालिकामा भए गरेका केहि गतिविधीहरु





प.सं. ०८६७८८
च.नं. ३७५३

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

०८३-५२०१८८
इमेल : surkhet@dolma.gov.np

मिति: २०७७/१२/११


विषय: सूचना टाँस गरि जानकारी पठाइदिने सम्बन्धमा ।

- श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत ।
- श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सुर्खेत ।
- श्री नापी कार्यालय सुर्खेत ।
- श्री स्थानिय तह सबै सुर्खेत ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको मिति २०७७/१२/११ को भू-सेवा केन्द्र संचालनमा आएको सम्बन्धी सूचना थान एक यसै पत्रसाथ संलग्न राखि पठाइएको छ । तहाँ कार्यलयको सूचना पाटीमा टाँस गरि सोको जानकारी पठाइदिनुहुन अनुरोध छ ।

श्री. पौडेल २०८०.०८.०८
Bhuvan Point नै वाहुनामका जिल्ला
Bhuvan Point नै वाहुनामका जिल्ला
२०८१

२०८१
(हिममत जंग शाही)
प्रमुख मालपोत अधिकृत



भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा जनशक्ति विभाग
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

फोन नं. २०९८८

ईमेल : surkhet@dolma.gov.np

प.सं. ५६६७६८
च.नं. २६६६

मिति: २०७७/१२/११

विषय: भू-सेवा केन्द्र संचालनमा आएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको मिति २०७७/१२/१० को निर्णयानुसार भू-सेवा केन्द्र संचालन निर्देशिका २०७६ को दफा ५ अनुसार तपशिल बमोजिमका भू-सेवा केन्द्रहरूलाई दफा १४ अनुसारका कार्यहरू गर्न अनुमति दिइएको र यस मालपोत कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरू मिति २०७७/१२/१६ गते देखि भू-सेवा केन्द्र मार्फत मात्र हुने भएकोले तपशिल अनुसारका भू-सेवा केन्द्रहरू मार्फत सेवा लिन आउनुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

तपशिल:-

क्र.सं.	निवेदन नम्बर	प्रयोगकर्ताको नाम	प्रयोगकर्ताको नामथर	प्रयोगकर्ताको प्रकार	सम्पर्क नम्बर
१	214601	bjaya123	विजय अधिकारी	व्यक्ति/लेखापढी	९८६८०११२२४
२	215651	narhari	नरहरी जैसी	व्यक्ति/लेखापढी	९८५८०५२५९४
३	216601	lokprasad	लोक प्रसाद लामिछाने	व्यक्ति	९८४८०६८९९१
४	216651	dhanraj	धनराज गुरुङ्ग	व्यक्ति	९८५८०३७७९४
५	216701	obsunar	विपेश सुनार	व्यक्ति	९८४८०४७८८९
६	216751	tirtha1	तिर्थराज अधिकारी	व्यक्ति	९८५८०७०५४५
७	216801	bhaktasubedi225	भक्त बहादुर सुवेदी	व्यक्ति	९८६८२३७२२५
८	217151	shalbahadurkhatr	शाल बहादुर खत्री	व्यक्ति/लेखापढी	९८४८२७२००९
९	217201	devkumaroll	देव कुमार वली	व्यक्ति	९८४८२२७३३९
१०	217251	shishirnyaupane372	शिशिर न्यौपाने	व्यक्ति/लेखापढी	९८४८३३३७२
११	217301	santoshbk	सन्तोष बि.क.	व्यक्ति	९८६९९७६९६५
१२	217351	gangagc546	गंग बहादुर जि.सी.	व्यक्ति/लेखापढी	९८५८०५०५४६
१३	217401	tikaramadhikari9763	टिकाराम अधिकारी	व्यक्ति/लेखापढी	९८५८०३९७६३
१४	217501	hupendra	हुपेन्द्र प्रसाद आचार्य	व्यक्ति/लेखापढी	९८४८०३९००२
१५	217651	devi	देवी लामिछाने मगर	व्यक्ति	९८४८३९९४६६
१६	217701	khadkabalkrishna	खड्का बालकृष्ण खड्का	व्यक्ति	९८६८२६९५०५
१७	217751	manojshahi	मनोज शाही	व्यक्ति/लेखापढी	९८६८०९०८९८
१८	217801	sb406152	शेर बहादुर बुढा	व्यक्ति	९८६७६९९९८३
१९	217951	dbshahi	दिप बहादुर शाही	व्यक्ति/लेखापढी	९८४८२२४९९२
२०	218001	dharmadevpuri	धर्मदेव पुरी	व्यक्ति/लेखापढी	९८४८०५०८९५
२१	218051	ambar	अम्बरसि कटुवाल	व्यक्ति/लेखापढी	९८४८०३७९३०
२२	218151	rkcsahi	रिता के सी शाही	व्यक्ति/लेखापढी	९८४८०४१०७९
२३	218251	hbsunar	हरी बहादुर सुनार	व्यक्ति/लेखापढी	९८४८२२९८७०
२४	218301	sarbaraj	मदन बहादुर खड्का	व्यक्ति	९८५८०५१९७५

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

०५३-५२०१८८

ईमेल: surkhet@dolma.gov.np

२५	218351	nabinsharma	नबिन गैरे	व्यक्ती	९८६१११३२०५
२६	218401	sashiram066	शसिराम सुनाइ	व्यक्ति	९८४८०३९०६६
२७	218501	surendra2049	सुरेन्द्र रेग्मी	व्यक्ति	९८४८८२८२४०
२८	218551	topendra	टोपेन्द्र बिस्नी	व्यक्ति	९८४८०३५४३४
२९	218601	mallikadesktop	निम बहादुर बुढा	व्यक्ति	९८४८०३८०४१
३०	218651	khadgabh391	खड्ग बहादुर बिके	व्यक्ति/लेखापढी	९८४८०४९७४१
३१	218801	dibya_baral	दिव्येश्वर बराल	व्यक्ति	९८५८०५८२६३
३२	218851	balaramsapkota	बालाराम सापकोटा	व्यक्ति	९८४८०४८०२३
३३	219151	chadanloll	चौदनि बली	व्यक्ति/लेखापढी	९८५८०५१७७६
३४	219601	dipendrakoirala777	दिपेन्द्र कोइराला	व्यक्ति/लेखापढी	९८४४८६५७७७
३५	220801	rcneupane	राम चन्द्र न्यौपाने	व्यक्ती	९८५८०६२६२९
३६	220951	kchirdesh	हृदेश कुमार केसी	व्यक्ती	९८४८०७९२०६
३७	222801	tirtha123	तिर्थराज गिरी	व्यक्ति/लेखापढी	९८४८०३०९९२
३८	227801	mandevpuri	मानदेव पुरी	व्यक्ति/लेखापढी	९८४८०००६५७
३९	228001	upjharendra	सुपेन्द्र राज उपाध्याय	व्यक्ति/लेखापढी	९८४८००५२७०
४०	241601	prithivi	इन्द्र बहादुर शाही	व्यक्ती/लेखापढी	९८६६२०७७७५
४१	246251	omprakash143	ओम प्रकाश शर्मा	व्यक्ति	९८५८०५२०६०
४२	246701	nabinbaskota2054	नबिन बास्कोटा	व्यक्ती	९८४४८२७५७८
४३	246951	tekamahatara	टेक बहादुर महतारा	व्यक्ती	९८४८०६३८७३
४४	247101	sambhuthapa	शम्भू थापा	व्यक्ती	९८५८०७०९९०
४५	247901	lokrajaadhikari	लोक राजा अधिकारी	व्यक्ति/लेखापढी	९८४८१२१९५९
४६	247951	narayanbudha123	नारायण बुढा क्षेत्री	व्यक्ति/लेखापढी	९८४८००२८९३
४७	248951	t1t2	तिलक कुमार विक	व्यक्ति	९८४८०४७८६४
४८	249051	puspak	पुष्पक पन्त	व्यक्ति	९८६३१६२२००
४९	249251	raju54	राजु केसी	व्यक्ती	९८६९७३६५५३
५०	249301	ukbsskt	सुवास अधिकारी	व्यक्ती	९८५८०६४००१
५१	218701	Bishaldhakal	बिसाल ढकाल	व्यक्ती	९८१९५८६१८५
५२	248801	Chandraprakash	चन्द्रप्रकाश राना	व्यक्ती	९८४८११५४०२
५३	249601	Rjdil	दिल बहादुर रोकाम	व्यक्ती	९८४८०९३८५१

(हिवमतेज गौरी) शाही
प्रमुख निपत्तापति अधिकारी

केहि सुझाव र सल्लाह.....

धन्यवाद ।
